



gemeente
WOERDEN

Aan de bewoners van Voorhuis, Overzicht, Spijkerlaan en
Hallehuis in Kamerik

Blekerijlaan 14
3447 GR Woerden
Postbus 45
3440 AA Woerden

Telefoon 14 0348
Fax (0348) 42 4108
stadhuis@woerden.nl
www.woerden.nl

Onderwerp:
Voortgang reconstructiewerkzaamheden

BTW-nummer
NL0017.21.860.B.02
KvK-nummer
50177214
IBAN-nummer
NL41BNGH0285009672

Uw Kenmerk:

Uw brief van:
geregistreerd onder nr.: n.v.t. of nummer

Datum: 21 juni 2016

Ons Kenmerk:

Doorkiesnummer/Behandeld door:
8750 / R. Mulder

Verz. **22 JUNI 2016**

U- 1 3 7 9 6

Beste meneer/mevrouw,

Met deze brief willen wij u op de hoogte brengen over de voortgang van de werkzaamheden. Op de bijgesloten plattegrond ziet u wanneer uw deel van de straat aan de beurt is.

Rioleringswerkzaamheden

Alleen in het Overstek moet de riolering nog worden aangelegd. Deze werkzaamheden zijn in twee fasen verdeeld.

Het riool in het Overstek tussen Voorhuis en Overzicht wordt vanaf a.s. maandag, 27 juni, aangelegd. Deze rioleringswerkzaamheden zijn voor de bouwvak, 22 juli, gereed.

Na de bouwvak, 15 augustus, wordt het riool tussen het Overzicht en de Mijzijde vervangen. Deze werkzaamheden zijn op 9 september gereed.

Het verkeer over het Overstek kan over rijplaten langs de rioleringswerkzaamheden rijden.

Verhardingswerkzaamheden

De verhardingswerkzaamheden verlopen voorspoedig. De bijgevoegde planning is ten opzichte van de vorige planning aangepast.

Voor het Overzicht geldt dat alle opsluitbanden tussen de tuinen en het trottoir voor 22 juli zijn aangebracht. Deze tuinen kunnen dan ook voor de bouwvak op hoogte worden afgewerkt.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neemt u dan contact met ondergetekende, via 0348 428750 of mulder.r@woerden.nl

Wilt u meer weten over de uitvoering? Neemt u dan contact op met de toezichthouder de heer P. Matthijssen, via 06 51269511.

Op alle leveringen en overeenkomsten zijn onze algemene inkoopvoorwaarden van toepassing (www.woerden.nl)

Datum: 21 juni 2016
Behandeld door: R. Mulder
Onderwerp: Voortgang reconstructiewerkzaamheden


Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders




Rik Mulder
Projectleider
Team Realisatie en Beheer

Bijlage: plattegrond met werkvakken/fasen uitvoering

aanbrengen verhardingen

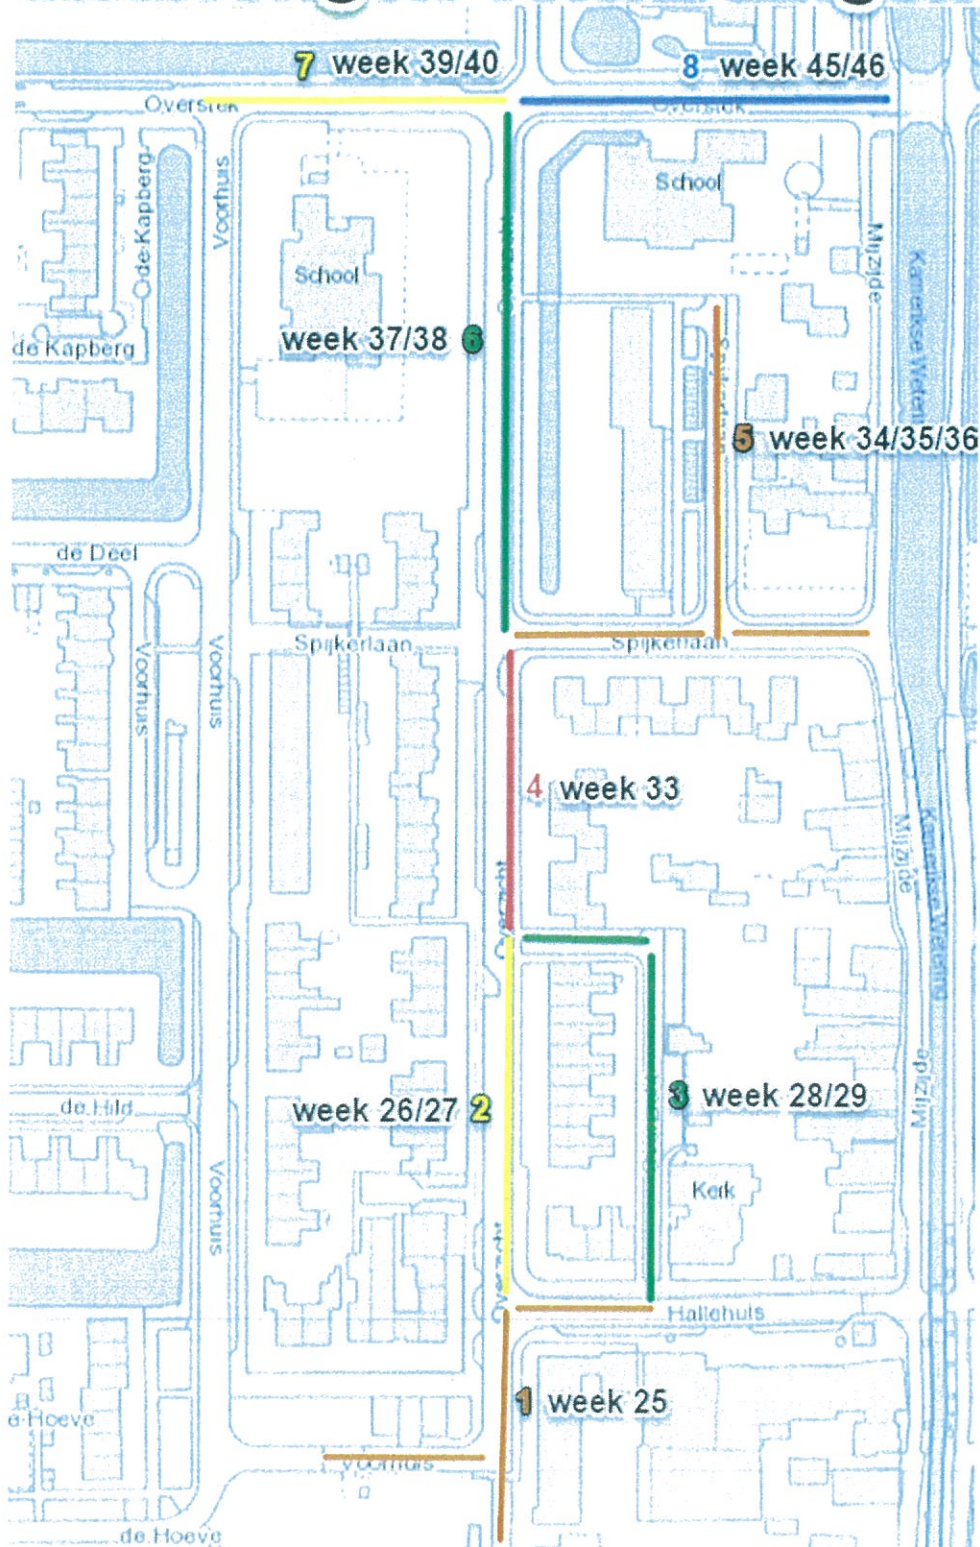

Datum: 21 juni 2016
 Behandeld door: R. Mulder
 Onderwerp: Voortgang reconstructiewerkzaamheden

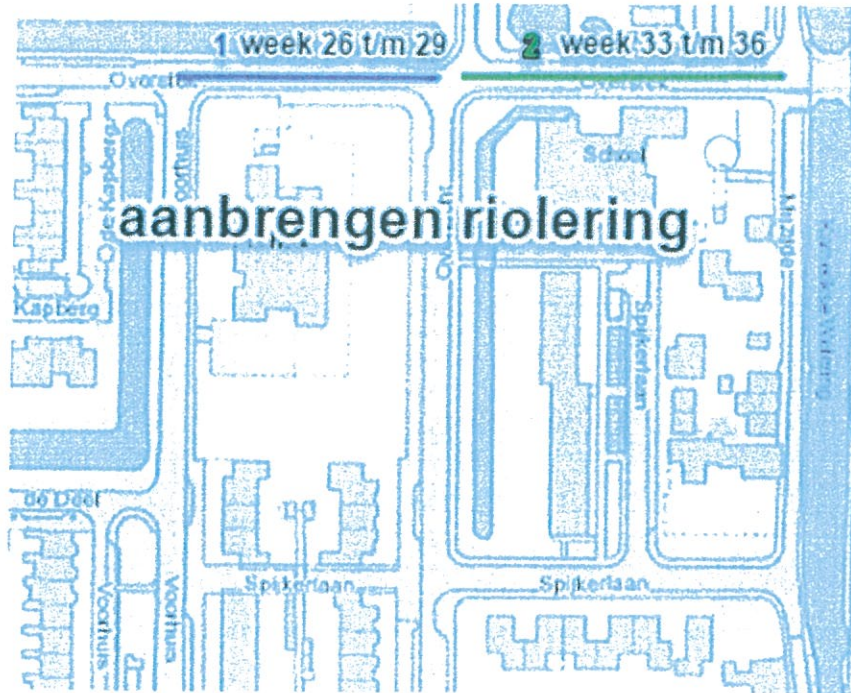

April 2016							
Nr	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
13					1	2	3
14	4	5	6	7	8	9	10
15	11	12	13	14	15	16	17
16	18	19	20	21	22	23	24
17	25	26	27	28	29	30	

Mei 2016							
Nr	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
17							1
18	2	3	4	5	6	7	8
19	9	10	11	12	13	14	15
20	16	17	18	19	20	21	22
21	23	24	25	26	27	28	29
22	30	31					

Juni 2016							
Nr	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
22			1	2	3	4	5
23	6	7	8	9	10	11	12
24	13	14	15	16	17	18	19
25	20	21	22	23	24	25	26
26	27	28	29	30			

Juli 2016							
Nr	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
26					1	2	3
27	4	5	6	7	8	9	10
28	11	12	13	14	15	16	17
29	18	19	20	21	22	23	24
30	25	26	27	28	29	30	31

Augustus 2016							
Nr	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
31	1	2	3	4	5	6	7
32	8	9	10	11	12	13	14
33	15	16	17	18	19	20	21
34	22	23	24	25	26	27	28
35	29	30	31				

September 2016							
Nr	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
35				1	2	3	4
36	5	6	7	8	9	10	11
37	12	13	14	15	16	17	18
38	19	20	21	22	23	24	25
39	26	27	28	29	30		

Oktober 2016							
Nr	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
39					1	2	
40	3	4	5	6	7	8	9
41	10	11	12	13	14	15	16
42	17	18	19	20	21	22	23
43	24	25	26	27	28	29	30
44	31						

November 2016							
Nr	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
44	1	2	3	4	5	6	
45	7	8	9	10	11	12	13
46	14	15	16	17	18	19	20
47	21	22	23	24	25	26	27
48	28	29	30				

December 2016							
Nr	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
48				1	2	3	4
49	5	6	7	8	9	10	11
50	12	13	14	15	16	17	18
51	19	20	21	22	23	24	25
52	26	27	28	29	30	31	
