




## Nieuwsbrief Reconstructie De Kanis

Vanaf nu informeren wij u maandelijks over de voortgang van de werkzaamheden en kijken we samen met u vooruit naar de komende periode op het project. In deze nieuwsbrief vertellen wij iets over de werkzaamheden rondom het Oortjespad, de planning van de werkzaamheden na de bouwvak en stellen wij ons team buiten aan u voor.

Sinds 2 juli zijn wij gestart met onze werkzaamheden. We zijn begonnen met de aanleg van de passeerplaatsen op het Oortjespad. Deze werkzaamheden bestonden onder andere uit het plaatsen van damwanden en het realiseren van de fundering. Als laatste hebben we het asfalt aangebracht. Tijdens de aanleg van de westelijke passeerplaats hebben wij het fietsverkeer omgeleid via een tijdelijke brug (afbeelding 1). Door de inzet van deze brug heeft het fietsverkeer altijd doorgang gehad over het Oortjespad.

Naast het realiseren van de passeerplaatsen hebben wij in deze periode ook de bypass en het fietspad naast het Oortjespad gemaakt. De werkzaamheden van het fietspad bestonden uit het aanleggen van de fundering met daaronder een folie en aanbrengen van het asfalt. Ter hoogte van de bypass zijn we gestart met ontgravingswerkzaamheden gevolgd door het aanbrengen van EPS (piepschuim). Op het EPS hebben we zand en puinfundering aangebracht. Als laatste is de

bypass geasfalteerd. Het asfalteren van de bypass is op dezelfde dagen als het asfalteren van het fietspad en de passeerstroken uitgevoerd.

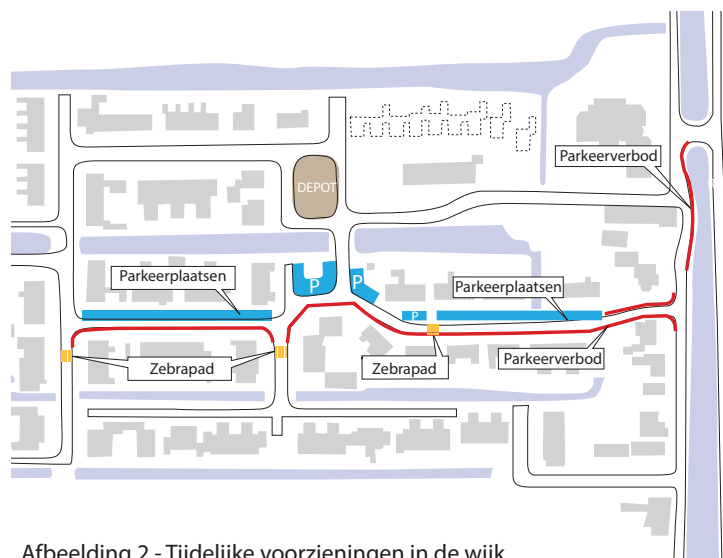

Afbeelding 2 - Tijdelijke voorzieningen in de wijk

### Start in de wijk

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij een groot deel van de planning van onze werkzaamheden toegelicht. Vanaf week 34 starten wij met het aanbrengen van de tijdelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Welke maatregelen worden aangebracht en waar deze worden uitgevoerd hebben wij weergegeven in afbeelding 2. Daarnaast worden vanaf week 34 de containers in de wijk geplaatst waar de bewoners van fase 1A, Reigerstraat en Leeuwerikstraat, hun tuinafval in kunnen deponeren.

Vanaf week 36 starten wij met het aanbrengen van de dammen ter hoogte van de Reigerstraat en de Leeuwerikstraat. Op deze dammen worden de tijdelijke aansluitingen van het kavelpad op de woonwijk gemaakt.



Afbeelding 1 - Tijdelijke brug ten behoeve van doorgang fietsers Oortjespad



Afbeelding 3 - Het eindresultaat.

## Speeltuín Reigerstraat

In augustus wordt door ons de tijdelijke speeltuin ingericht. Deze speeltuin komt naast het voetbalveldje aan de Reigerstraat. Hier zullen wij onder andere een glijbaan, een klimrek en twee wipkippen neerzetten. Ook wordt er een picknickbank en vuilnisbak geplaatst.

### Meerkoetstraat

In augustus wordt er door de aannemer Van Vulpen een gestuurde boring uitgevoerd. Deze boring wordt uitgevoerd ten behoeve van de middenspanningskabel. Van Vulpen informeert de aanwonenden hierover.

## Het team van Bunnik Groep

Misschien heeft u ons team buiten al gezien ter hoogte van het Oortjespad? Vanaf 22 augustus zijn zij elke werkdag in De Kanis aanwezig.



Afbeelding 4 - Het team van Bunnik Groep v.l.n.r.: Kevin Rosman (uitzetter), Koos Verkleij (kraanmachinist), Jeroen Verstoep (uitvoerder)

Onze uitvoerder tijdens dit project is Jeroen Verstoep. Jeroen werkt sinds januari bij Bunnik Groep. In deze nieuwsbrief stellen wij hem aan u voor.

### Wat is je specialiteit?

Op het gebied van reconstructies ben ik een allrounder. Ik heb op meerdere disciplines ervaring op gedaan die ik nu op dit project goed kan toepassen.

### Waar ben jij verantwoordelijk voor tijdens het project?

Op dit project zorg ik ervoor dat buiten alles in goede banen verloopt en de planning wordt gehaald. Wanneer we tijdens de uitvoering problemen tegen komen los ik deze samen met het team op.

### Wat vind jij tijdens dit project belangrijk?

Dat alles naar wens verloopt, voor zowel de bewoners in de wijk als voor de gemeente. Het werk moet worden uitgevoerd met weinig overlast voor de bewoners. Tijdens mijn werk streef ik naar perfectie met zo weinig mogelijk hinder.

### Wat zijn je hobby's?

Alles wat met water te maken heeft. Zwemmen, varen, vissen, etc. Daarnaast doe ik aan fitness.

### Waar mogen we je voor wakker maken?

Zelfgebakken appeltaart!

## Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Dan kunt u de werkzaamheden volgen via de Omgevingsapp!



Download De Omgevingsapp gratis in de Appstore of Playstore. De omgevingsapp is herkenbaar aan dit oranje logo.



Als u het project 'De Kanis' aanvinkt dan ontvangt u berichten als wij nieuwe informatie online zetten.

## Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden van Bunnik Groep, dan kunt u deze stellen aan onze gebiedsmanager Alexandra Braas. Dit kan via [06-38106938](tel:06-38106938) of via [dekanis@bunnikgroep.nl](mailto:dekanis@bunnikgroep.nl)

Volgende nieuwsbrief September

In de volgende nieuwsbrief vertellen wij iets over de opening van het informatiecentrum en het inloopuur!

Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet digitaal? Geef uw e-mailadres dan op via [dekanis@bunnikgroep.nl](mailto:dekanis@bunnikgroep.nl)
